공 사 예 정 공 정 표

공 사 명: 인천 공공리모델링 건설공사(17차 A)
공사위치 : 인천시 부평구외
공사기간 : 2018. 06. 11 - 2018. 11. 17
작성일자 : 2017. 06. 11

시 공 사	태하종합건설 주식회사 대표이사 장 경 미 (인)
공사감리경유	㈜성우엔지니어링 종합건축사 사무소

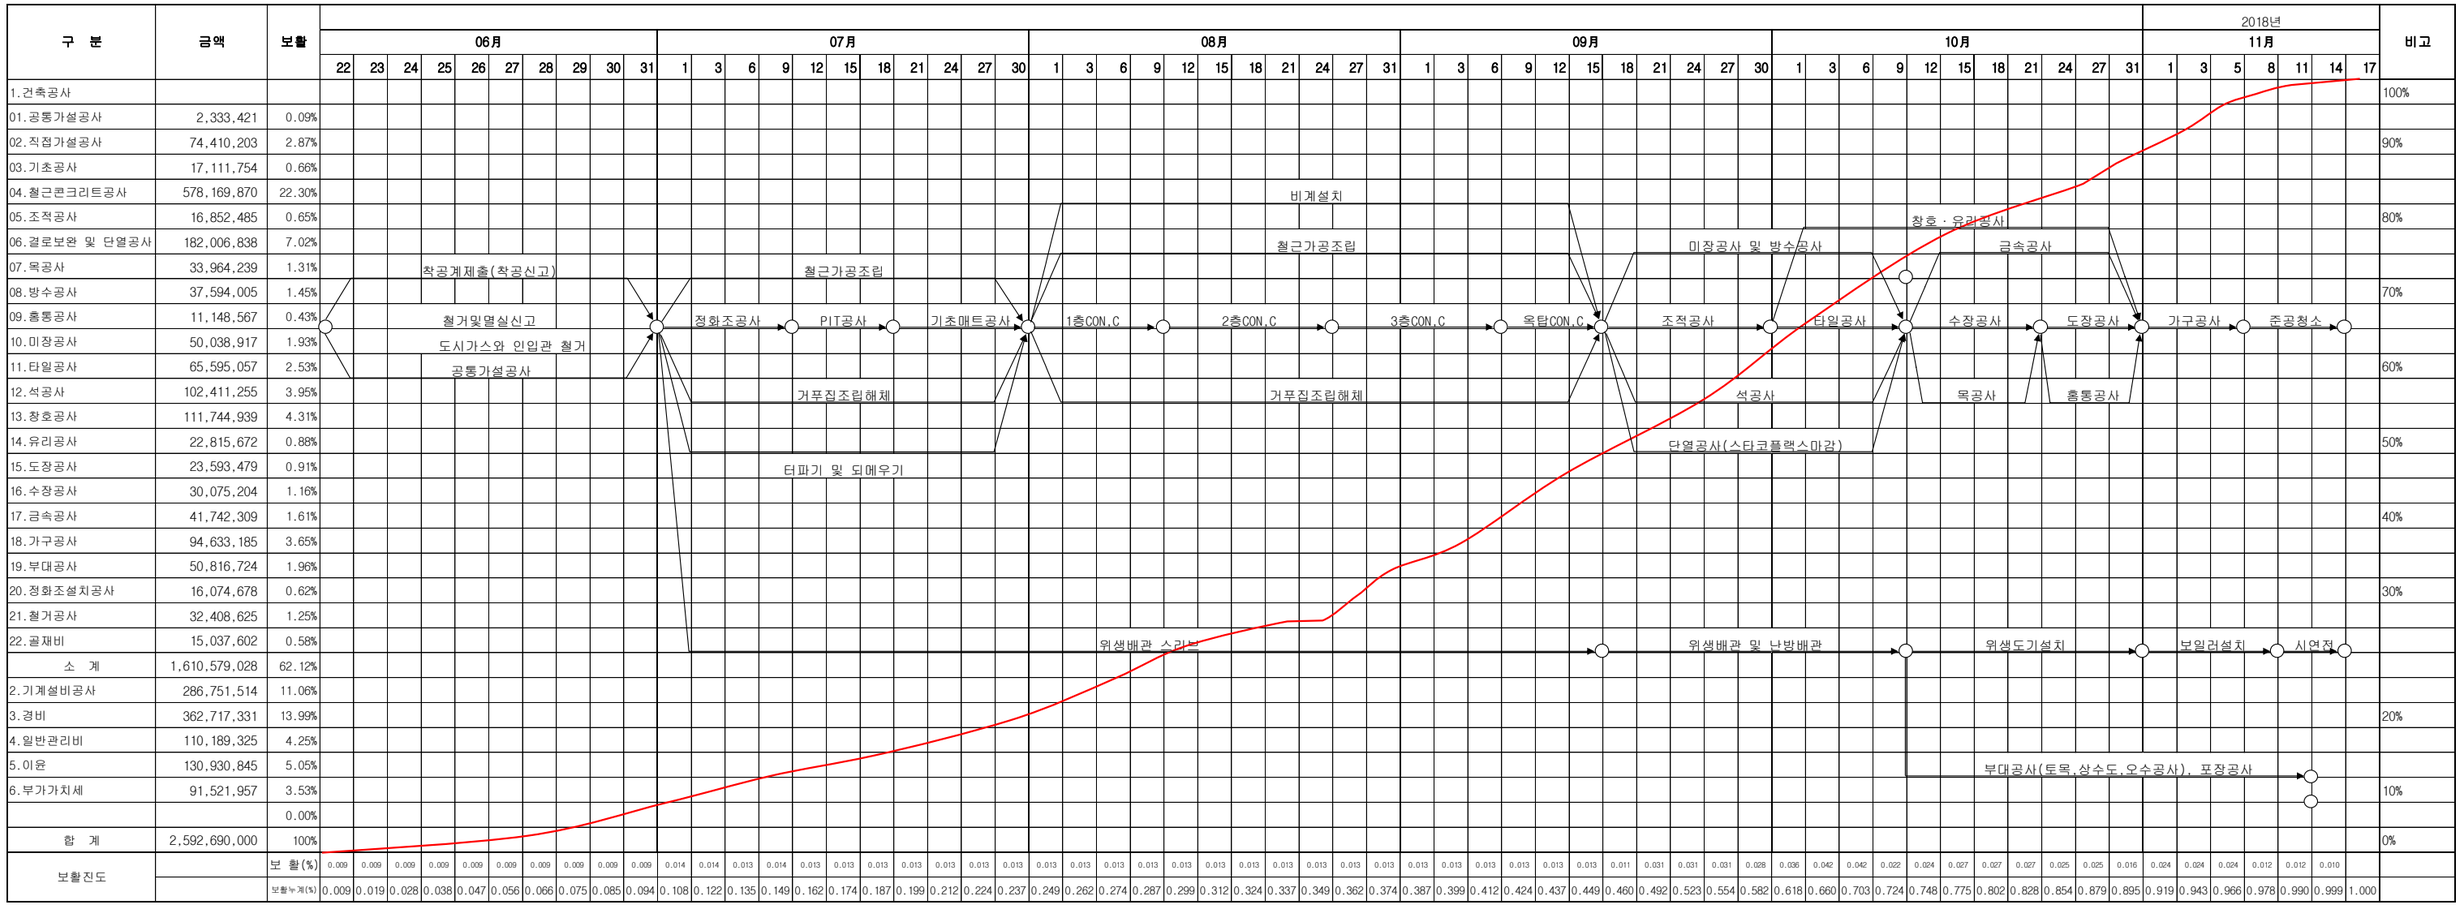

구 분	금액	보합	비고
1.건축공사			100%
01.공통가설공사	2,333,421	0.09%	
02.직접가설공사	74,410,203	2.87%	90%
03.기초공사	17,111,754	0.66%	
04.철근콘크리트공사	578,169,870	22.30%	
05.조적공사	16,852,485	0.65%	80%
06.결로보완 및 단열공사	182,006,838	7.02%	
07.목공사	33,964,239	1.31%	
08.방수공사	37,594,005	1.45%	70%
09.홍통공사	11,148,567	0.43%	
10.미장공사	50,038,917	1.93%	
11.타일공사	65,595,057	2.53%	60%
12.석공사	102,411,255	3.95%	
13.창호공사	111,744,939	4.31%	
14.유리공사	22,815,672	0.88%	50%
15.도장공사	23,593,479	0.91%	
16.수장공사	30,075,204	1.16%	
17.금속공사	41,742,309	1.61%	40%
18.가구공사	94,633,185	3.65%	
19.부대공사	50,816,724	1.96%	
20.정화조설치공사	16,074,678	0.62%	30%
21.철거공사	32,408,625	1.25%	
22.골재비	15,037,602	0.58%	
소 계	1,610,579,028	62.12%	
2.기계설비공사	286,751,514	11.06%	
3.경비	362,717,331	13.99%	20%
4.일반관리비	110,189,325	4.25%	
5.이윤	130,930,845	5.05%	
6.부가가치세	91,521,957	3.53%	10%
		0.00%	
합 계	2,592,690,000	100%	0%

보합진도		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	31	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	31	1	3	5	8	11	14	17
		보 합(%)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.031	0.031	0.031	0.028	0.036	0.042	0.042	0.022	0.024	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.016	0.024	0.024	0.024	0.012	0.012	0.010		
		보합누계(%)	0.009	0.019	0.028	0.038	0.047	0.056	0.066	0.075	0.085	0.094	0.108	0.122	0.135	0.149	0.162	0.174	0.187	0.199	0.212	0.224	0.237	0.249	0.262	0.274	0.287	0.299	0.312	0.324	0.337	0.349	0.362	0.374	0.387	0.399	0.412	0.424	0.437	0.449	0.460	0.492	0.523	0.554	0.582	0.618	0.660	0.703	0.724	0.748	0.775	0.802	0.828	0.854	0.879	0.895	0.919	0.943	0.966	0.978	0.990	0.999	1.000		
